

# Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uvAjPM00301

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 13.2  
Rozvoj městských a venkovských oblastí

**Oblast podpory:** 13.2.2  
Rozvoj měst

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Severovýchod

**Příjemce:** Město Semily

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.13/2.2.00/09.00533

**Název projektu:** Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)

**Kontaktní osoba:** Mach Daniel

**Adresa:** Semily, Husova, 82, 51301

**E-mail:** mach@mu.semily.cz

**Telefon:** 481629223

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 3

**Typ zprávy:** Etapová zpráva s žádostí o platbu

**Předpokládané datum předložení:** 26.03.2010

**Sledované období:** 21.01.2010 - 26.03.2010

### 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. číselníku:** 51.15.00

**Název indikátoru:** Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

**Jednotka:** Počet projektů


**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 1.00

**Datum dosažené hodnoty:**

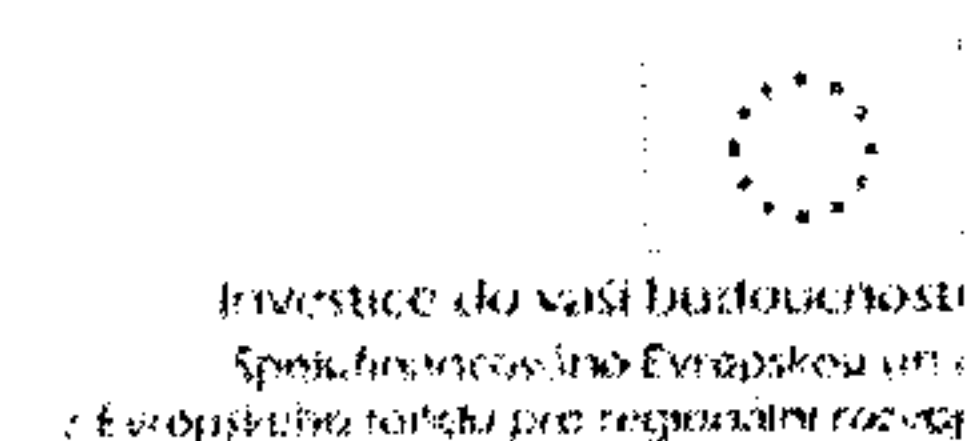



|                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 52.02.13                                                                          |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | PM                                                                                |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                              |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                              |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                              |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 3.00                                                                              |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                                   |



|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 64.01.01                                                          |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | Počet                                                             |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                              |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                              |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                              |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 1.00                                                              |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                   |

|                                                                   |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 64.01.04                                                                               |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | Počet                                                                                  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                                   |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                                   |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                                   |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 1.00                                                                                   |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                                        |

|                                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 65.01.00                                              |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | ha                                                    |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 0.52                                                  |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                       |



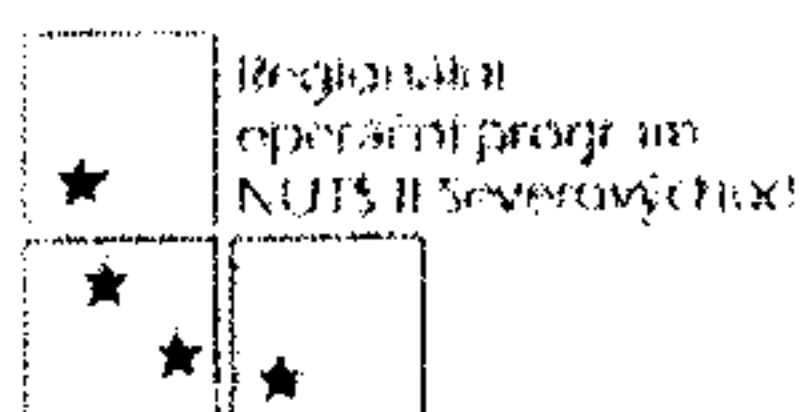

|                                                                   |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 65.11.01                                                                                |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | m2                                                                                      |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                                    |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                                    |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                                    |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 1 647.00                                                                                |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                                         |


|                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 65.11.02                                                                |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města) |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | m2                                                                      |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                    |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                    |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                    |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 399.00                                                                  |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                         |

|                                                                   |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 65.11.03                                                                                      |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | m2                                                                                            |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                                          |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                                          |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                                          |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 0.00                                                                                          |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                                               |

|                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód nár. číselníku:</b>                                        | 65.11.04                                                                              |
| <b>Název indikátoru:</b>                                          | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) |
| <b>Jednotka:</b>                                                  | m2                                                                                    |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                                           | 0.00                                                                                  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00                                                                                  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>                                          | 0.00                                                                                  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                                            | 1 248.00                                                                              |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    |                                                                                       |



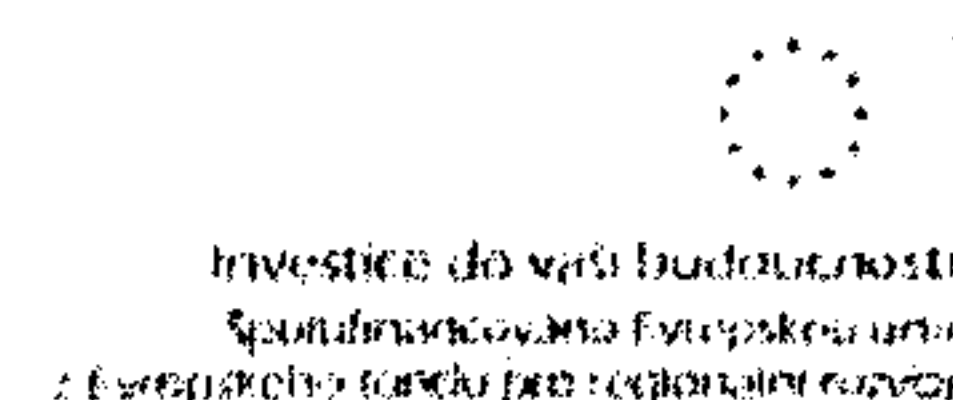

**Kód nár. číselníku:** 65.11.20

**Název indikátoru:** Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

**Jednotka:** ha

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním  
monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 0.02

**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 65.20.00

**Název indikátoru:** Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů  
(brownfields) celkem

**Jednotka:** ha

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním  
monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 0.10

**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 65.20.03

**Název indikátoru:** Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci  
brownfields

**Jednotka:** m2



**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním  
monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 1 647.00

**Datum dosažené hodnoty:**

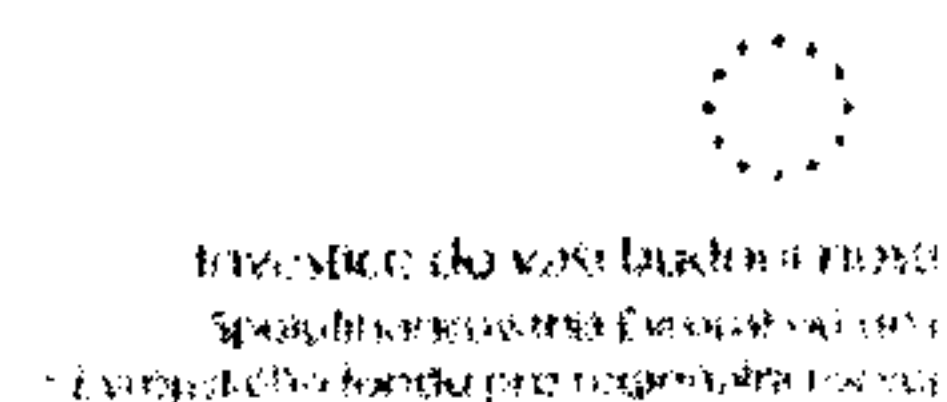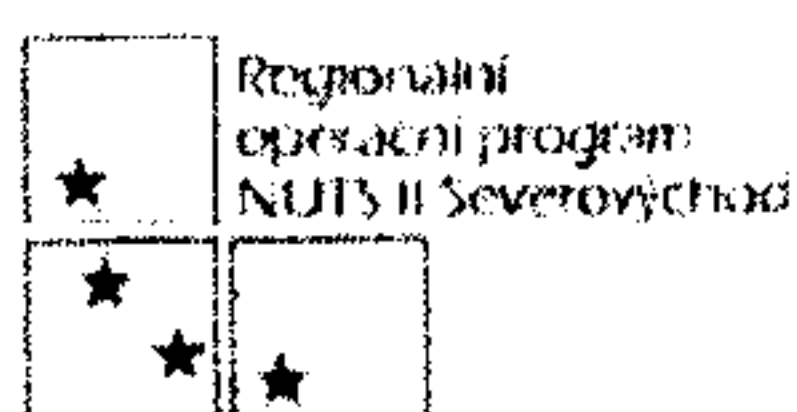




#### **4. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo VŘ:** 001  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Administrátor projektu  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení zrušeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 435 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 02.03.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.04.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 002  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Stavební úpravy kina Jitřenka  
**Postup při VŘ:** Otevřené řízení podlimitní  
**Druh VŘ podle předmětu:** Stavební práce  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 54 099 999.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 30.04.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 17.07.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 003  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 198 600.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 09.06.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 15.07.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**


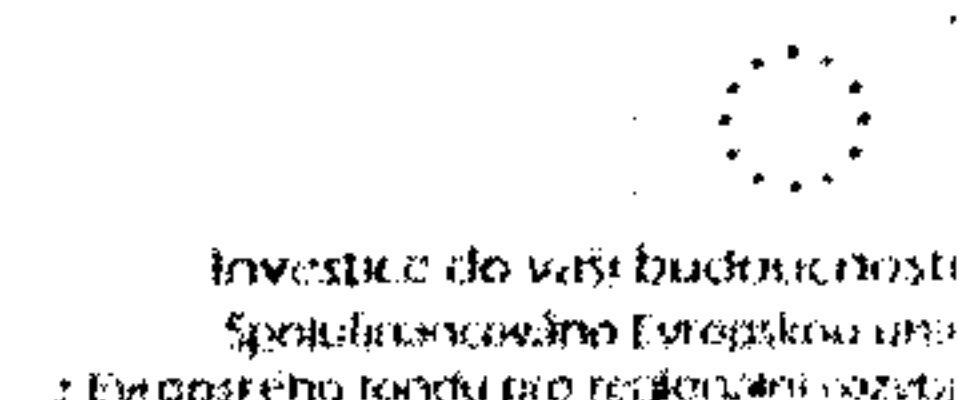




**Pořadové číslo VŘ:** 004  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Dodržení pravidel publicity - propagace projektu  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 28 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 01.07.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.06.2011  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 005  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Dodržování pravidel publicity - billboard  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 29 400.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 17.06.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 26.06.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 006  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Dodržení pravidel publicity - pamětní deska  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 3 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 02.05.2011  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.06.2011  
**Dodavatelé výběrového řízení:**


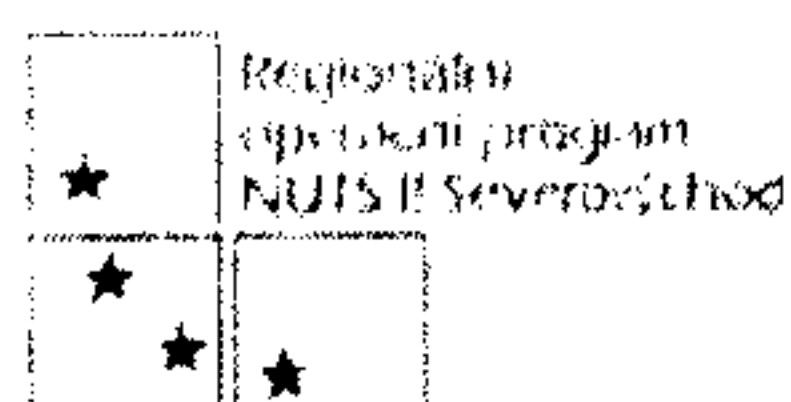




**Pořadové číslo VŘ:** 007  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Rekonstrukce Riegrova náměstí  
**Postup při VŘ:** Otevřené řízení podlimitní  
**Druh VŘ podle předmětu:** Stavební práce  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 14 780 910.57  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 25.09.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 18.02.2010  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 008  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Zajištění výběrového řízení na dodavatele Stavební úpravy kina Jitřenka  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 60 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 20.03.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 10.04.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 009  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Technický dozor stavebníka Riegrovo náměstí II.etapa  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení zahájeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 121 686.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 02.02.2010  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 04.03.2010  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

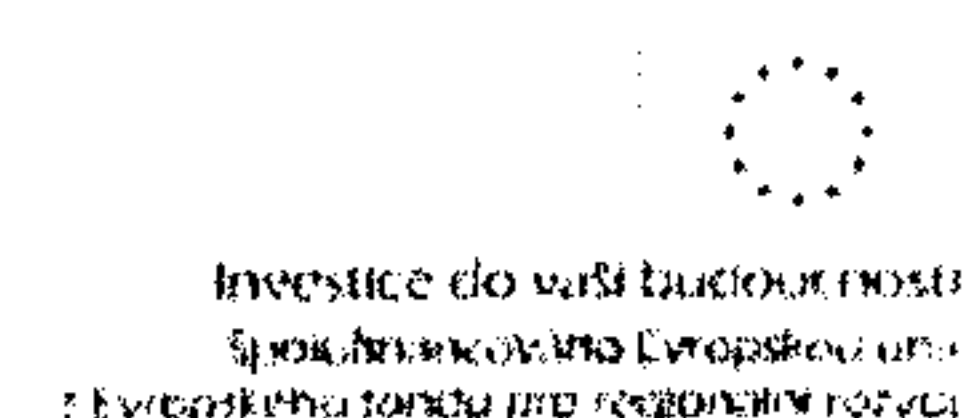
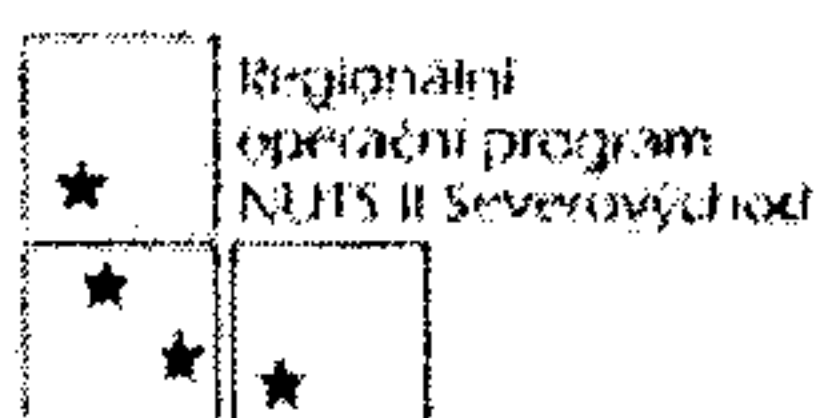




**Pořadové číslo VŘ:** 010  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Projektová dokumentace kina Jitřenka  
**Postup při VŘ:** Zjednodušené podlimitní řízení  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 1 246 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 12.02.2007  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 12.04.2007  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 011  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Projektová dokumentace Riegrova náměstí  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 666 120.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 25.09.2006  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 13.11.2006  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 012  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Zajištění výběrového řízení na tvorbu webových stránek - publicita  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 54 190.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 26.06.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 16.10.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

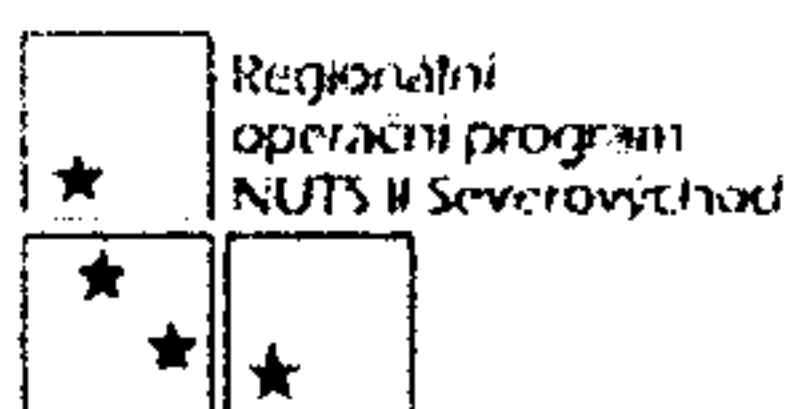



**Pořadové číslo VŘ:** 013  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název VŘ:** Koordinátor stavby  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):** 28 000.00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 07.08.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 07.08.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:**

## 5. Publicita

**Způsob zajištění publicity:** Další

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Budou uskutečněny další propagační akce. Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány v Semilských novinách, dále v Turnovském a Semilském deníku a regionální příloze MF Dnes. Informace budou na internetových stránkách města a budou zveřejňovány ve vysílání kabelové televize. Na tyto činnosti je navržena částka 8.000 Kč (9.520 Kč s DPH).

**Stav aktuální:** V Semilských novinách byl zveřejněn inzerát informující o realizaci projektu. Inzerát byl zveřejněn v 12/2009 a 2/2010.

**Způsob zajištění publicity:** Další

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Na autobusech budou umístěny reklamní poutače o realizaci projektu.

**Stav aktuální:** Připravujeme vzhled reklamních poutačů.

**Způsob zajištění publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ... )

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Před zprovozněním kina a náměstí budou vytištěny letáky (formát A4 nebo A5), které budou občanům města a návštěvníkům přinášet informace o rekonstrukci náměstí a o zprovozněném objektu kina Jitřenka. Budou respektována pravidla publicity, jak jsou definována v příloze č. 10 příručky pro žadatele. Na vytištění letáků je navržena částka 20.000 Kč (23.800 Kč s DPH).


**Stav aktuální:** Zatím nerelevantní, předpokládá se až před zprovozněním kina.

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Po kolaudaci stavby bude na budovu kina instalována tabulka - pamětní deska. Bude vyrobena z trvanlivého materiálu a bude zde umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. Svým provedením bude respektovat pravidla publicity podle přílohy č. 10 příručky pro žadatele. Na dodávku je navržena částka 3.000 Kč (5.570 Kč s DPH).

**Stav aktuální:** Nerelevantní - bude instalováno po skončení projektu.

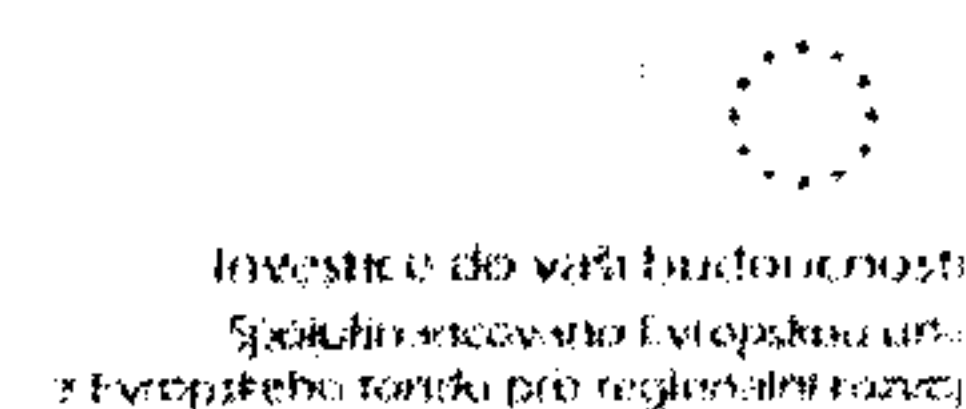



**Způsob zajištění publicity:** Propagační předměty

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci propagace při otevření kina budou vytvořeny drobné propagační předměty.

**Stav aktuální:** Hledáme vhodné propagační materiály.

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Na začátku stavebních prací bude na místě instalován velkoplošný reklamní panel. Veřejnost bude mít možnost získat základní informace o projektu, jeho realizaci, financování a předpokládaném termínu ukončení. Minimální rozměr billboardu bude 2,4 x 5,1 m. Na dodávku panelu je navržena částka 15.000 Kč (17.850 Kč s DPH).

**Stav aktuální:** Billboard byl na stavbu instalován se zahájením stavebních prací v srpnu 2009.

## **6. Rovné příležitosti**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Součástí knihovny bude vzdělávací centrum zaměřené na mládež, ale také na seniory

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Bezbariérově je řešen objekt kina i prostor Riegrova náměstí. V rámci objektu kina je navržen výtah do knihovny a kluboven, kinosál a kavárna jsou zpřístupněny v úrovni přízemí.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Objekt kina i celý prostor Riegrova náměstí bude vybaven prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.



**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci prostor knihovny je navržen výukový prostor a činnost knihovny bude rozšířena o komunitní a vzdělávací funkci.

**Stav aktuální:**

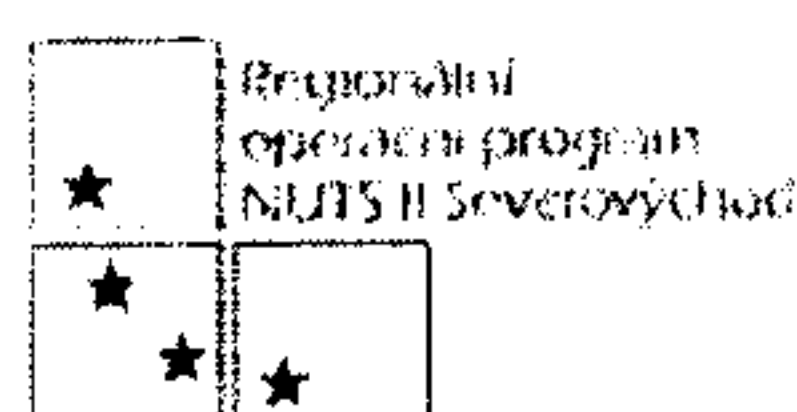



**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Součástí kinosálu a knihovny bude vybavení pro nevidomé a slabozraké.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Knihovna bude ve své činnosti rošířena o komunitní náplň.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Součástí prostor knihovny bude dětský koutek.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Součástí objektu kina budou dvě klubovny pro volnočasovou činnost mládeže. Navrženo je vybavení pro fotokroužek a kroužek videotvorby.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** projekt především upravuje přístup objektu a plochy pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, vytváří také vhodné plochy a neomezující přístup pro seniory. Stávající knihovna je v objektu, který nelze pro bezbariérový přístup upravit.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Publicita projektu bude prováděna se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel bez rozdílu.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.


**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Projekt kina byl konzultován se sdružením nevidomých a slabozrakých, které vzneslo požadavek na doplňkové vybavení kinosálu.

**Stav aktuální:**

## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

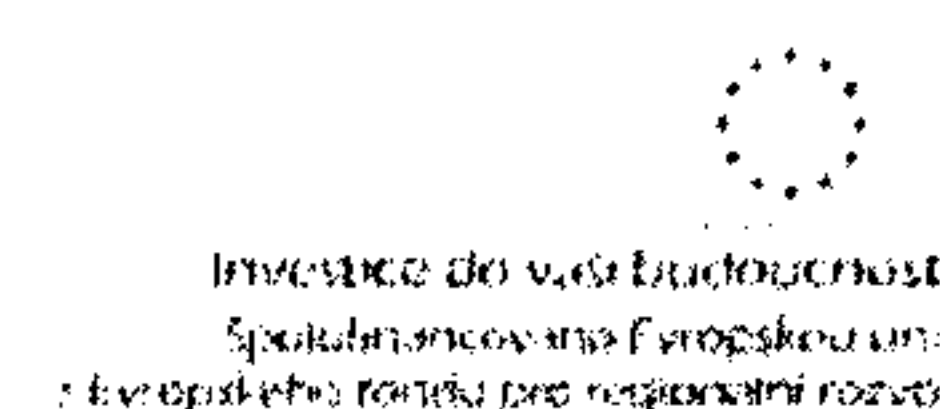



**Číslo:** 14  
**Název  
environemntálního  
kritéria:** Bude projekt realizován s využitím brownfields?

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 0.10

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Chátrající budova kina Jitřenka (plocha 1059 m2) je dnes využívána pouze z malé části. Je obsazen jeden byt v druhém patře. Budova bude rekonstruována a dojde k přístavbě objektu. Objekt bude využit k původnímu účelu jako kino, doplněno bude kavárny

**Aktuální stav:**

**Číslo:** 54  
**Název  
environemntálního  
kritéria:** Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 0.10

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Bude opětovně využita budova kina na Riegrově náměstí. Z celého objektu o ploše 1059 m2 je využíván pouze jeden byt ve druhém patře. Po dokončení stavebních úprav bude objekt využit pro kino, kavárnu a knihovnu.

**Aktuální stav:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Číslo:** 37  
**Název  
environemntálního  
kritéria:** Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Uprostřed města se mírně zvýší podíl zeleně a zvýší se úroveň péče o zeleň. Dojde ke zřízení zelených rabat podél přechodů, k výsadbě několika stromů v zelených plochách a ke zlepšení stavu okolí stávající lípy.



**Aktuální stav:**

**Číslo:** 45  
**Název  
environemntálního  
kritéria:** Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Obvodové zdivo objektu kina bude řádně zatepleno tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Na střeše budou instalovány solární panely pro ohřev teplé vody.

**Aktuální stav:**

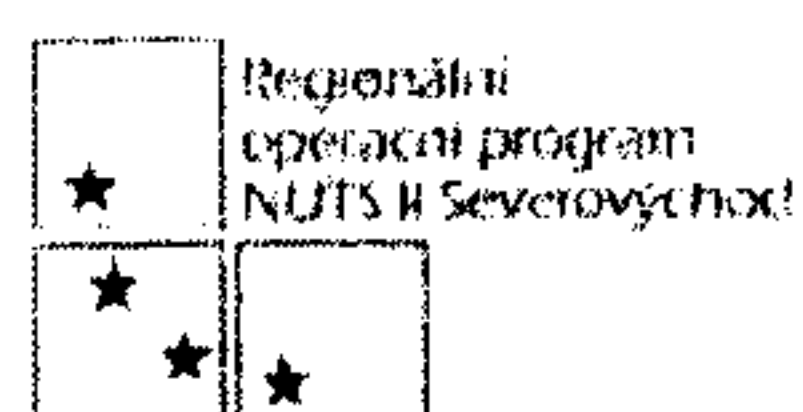



**Číslo:** 57

**Název** Příspěje projekt k rozšíření/záboru zelených ploch v rámci sídel? (ha)  
**environemntálního**  
**kritéria:**

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Uprostřed náměstí se mírně navýší plocha zeleně - o 218 m2. Budou vysazeny 45 stromy a zlepší se okolí stávající vzrostlé lípy.

**Aktuální stav:**

**Číslo:** 60

**Název** Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?  
**environemntálního**  
**kritéria:**

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Revitalizována bude jihovýchodní část náměstí, dojde k redukci parkovacích míst a bude zde vytvořen prostor pro posezení a shromažďovací prostor včetně možnosti umístění vánočního stromu. Regenerován bude objekt kina s doplněním kavárny a knihovny.

**Aktuální stav:**


**Číslo:** 63

**Název** Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?  
**environemntálního**  
**kritéria:**

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Budou zlepšeny technické parametry sítí, čímž se omezi ztráty médií. V objektu kina bude pro ohřev vody využito solárních panelů umístěných na střeše objektu.


**Aktuální stav:**

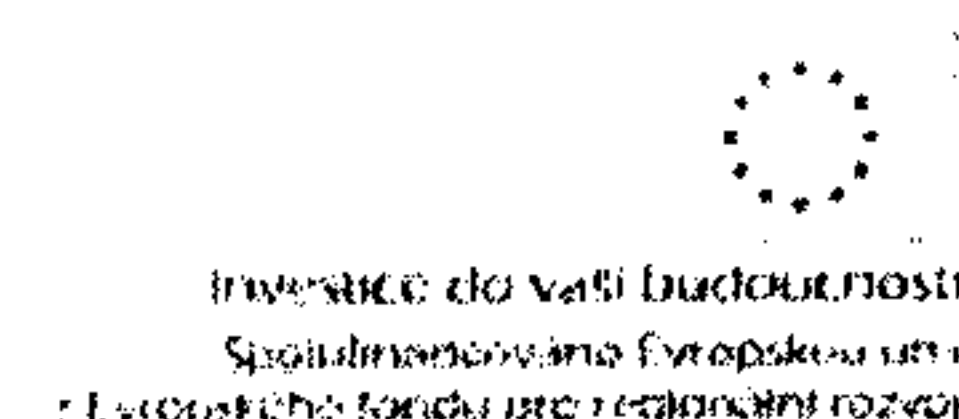



## 8. Rozpočet projektu



| Kód      | Název                                                                                           | Počet kusů | Cena kusu [Kč] | Výdaje celkem [Kč] | Z toho neinvestiční [Kč] | Procento | Jednotka |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|
| 01       | Hlavní výdaje                                                                                   | 0          | 0.00           | 89 334 658.55      | 2 375 367.78             | 98.72    |          |
| 01.01    | Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV) | 1          | 1 912 120.00   | 1 912 120.00       | 0.00                     | 2.11     |          |
| 01.02    | Nákup staveb                                                                                    | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.03    | Nákup pozemků (do 10% CZV)                                                                      | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04    | Stavební a technologická část stavby                                                            | 1          | 48 431 068.84  | 48 304 226.30      | 444 890.00               | 53.38    |          |
| 01.04.01 | Rezerva na vícepráce                                                                            | 1          | 2 307 742.22   | 2 307 742.22       | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04.02 | Stavební a technologická část stavby                                                            | 1          | 45 996 484.08  | 45 996 484.08      | 444 890.00               | 0.00     |          |
| 01.05    | Technická zařízení                                                                              | 1          | 12 813 904.56  | 12 813 904.56      | 33 350.00                | 14.16    |          |
| 01.06    | Základní vybavení                                                                               | 1          | 11 540 939.00  | 11 540 939.00      | 1 514 818.00             | 12.75    |          |
| 01.07    | Pořízení strojů a zařízení                                                                      | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.08    | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                                     | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.09    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                        | 1          | 14 763 468.69  | 14 763 468.69      | 382 309.78               | 16.31    |          |
| 02       | Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)                                                                    | 0          | 0.00           | 1 162 773.96       | 392 973.96               | 1.28     |          |
| 02.01    | Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity                                                   | 1          | 233 939.25     | 233 939.25         | 233 939.25               | 0.26     |          |
| 02.02    | Finanční výdaje                                                                                 | 1          | 4 500.00       | 4 500.00           | 4 500.00                 | 0.00     |          |
| 02.03    | Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO                                                             | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 02.04    | Nákup služeb                                                                                    | 1          | 741 400.00     | 741 400.00         | 91 400.00                | 0.82     |          |
| 02.05    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                        | 1          | 182 934.71     | 182 934.71         | 63 134.71                | 0.20     |          |
| 03       | Způsobilé výdaje celkem                                                                         | 0          | 0.00           | 90 497 432.51      | 2 768 341.74             | 100.00   |          |
| 04       | Nezpůsobilé výdaje celkem                                                                       | 1          | 2 246 943.56   | 2 246 943.56       | 10 161.76                | 2.48     |          |
| 05       | Celkové výdaje projektu                                                                         | 0          | 0.00           | 92 744 376.07      | 2 778 503.50             | 102.48   |          |

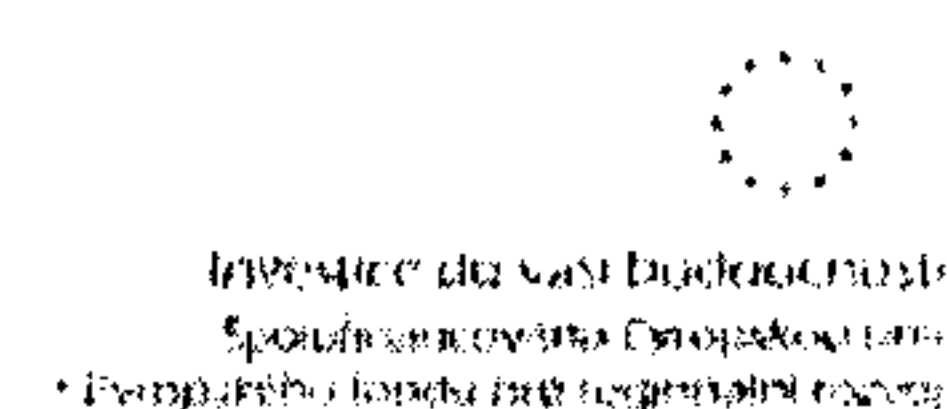



## 9. Přehled financování

|                                                                              | Výdaje projektu (v Kč) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Celkové zdroje:</b>                                                       | 92 744 376.07          |
| <b>Celkové způsobilé výdaje:</b>                                             | 90 497 432.51          |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>                                           | 2 246 943.56           |
| <b>Celkové způsobilé investiční výdaje:</b>                                  | 87 729 090.77          |
| <b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:</b>                                | 2 768 341.74           |
| <b>Příjmy projektu:</b>                                                      | 0.00                   |
| <b>Příjmy způsobilé:</b>                                                     | 0.00                   |
| <b>Příjmy nezpůsobilé:</b>                                                   | 0.00                   |
| <b>Způsobilé výdaje bez příjmů:</b>                                          | 90 497 432.51          |
| <b>Veřejné prostředky:</b>                                                   | 27 204 539.54          |
| <b>Soukromé prostředky:</b>                                                  | 0.00                   |
| <b>Dotace z rozpočtu RR:</b>                                                 | 63 292 892.97          |
| <b>z toho EU:</b>                                                            | 58 161 036.78          |
| <b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:</b>   | 90 497 432.51          |
| <b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:</b> | 2 246 943.56           |

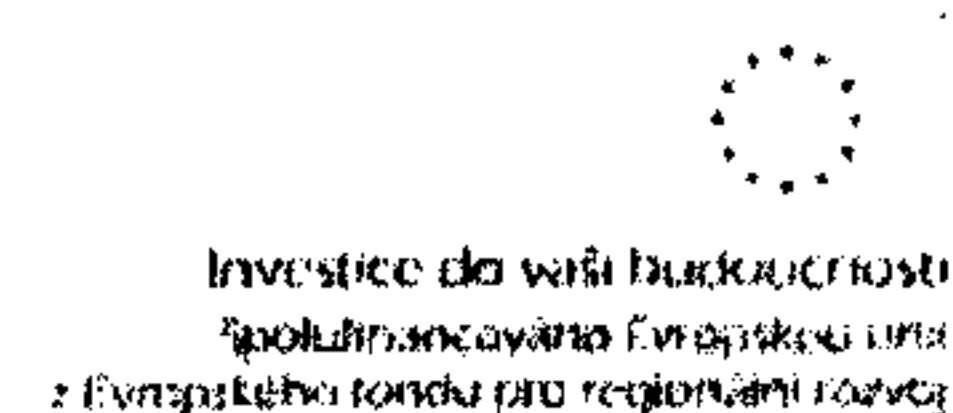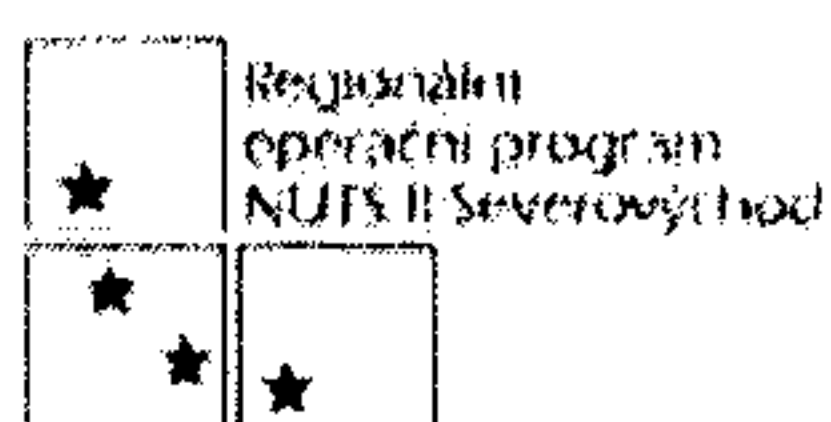



## **10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu: 01  
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 20.10.2009  
Částka dotace: 4 353 917.69  
Z toho neinvestiční: 57 044.53  
Skutečnost - částka dotace: 4 346 740.86  
Skutečnost - z toho neinvestiční: 49 936.36

Pořadí žádosti o platbu: 02  
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 26.03.2010  
Částka dotace: 7 582 326.15  
Z toho neinvestiční: 79 475.59  
Skutečnost - částka dotace: 0.00  
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00



Pořadí žádosti o platbu: 03  
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 01.07.2010  
Částka dotace: 40 815 552.85  
Z toho neinvestiční: 201 815.83  
Skutečnost - částka dotace: 0.00  
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

Pořadí žádosti o platbu: 04  
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 29.07.2011  
Částka dotace: 10 548 273.11  
Z toho neinvestiční: 1 604 919.49  
Skutečnost - částka dotace: 0.00  
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0.00

## **11. Prioritní téma**



Název prioritního tématu: Integrované projekty pro obnovu měst a venkova  
Číslo prioritního tématu: 61  
Odhad výdajů (Kč):  
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 58 161 036.78  
Aktuální stav: 58 161 036.78

## **12. Přílohy**

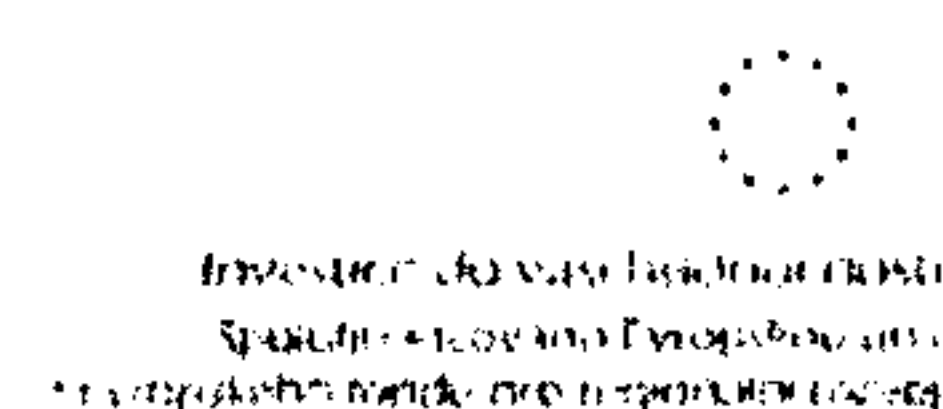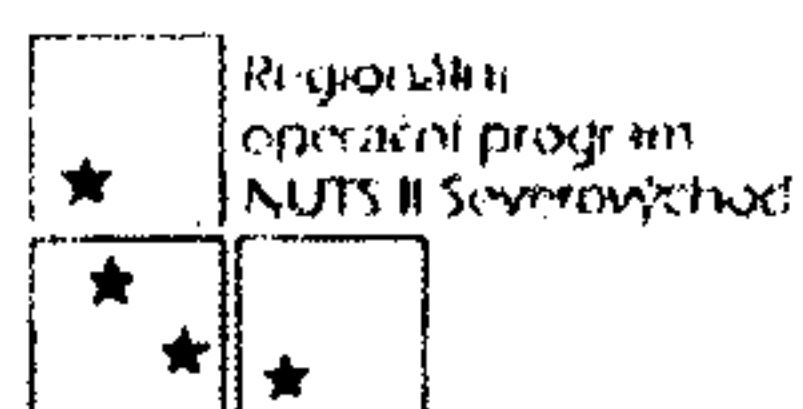



**Název přílohy:** Povinná příloha monitorovacích zpráv  
**Číslo přílohy:** 59  
**Požadovaná příloha:** přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** DVORAKOVA@MU.SEMILY.CZ  
**Příloha:** 11.20\_Povinná příloha monitorovacích zpráv.doc  
**Popis:**

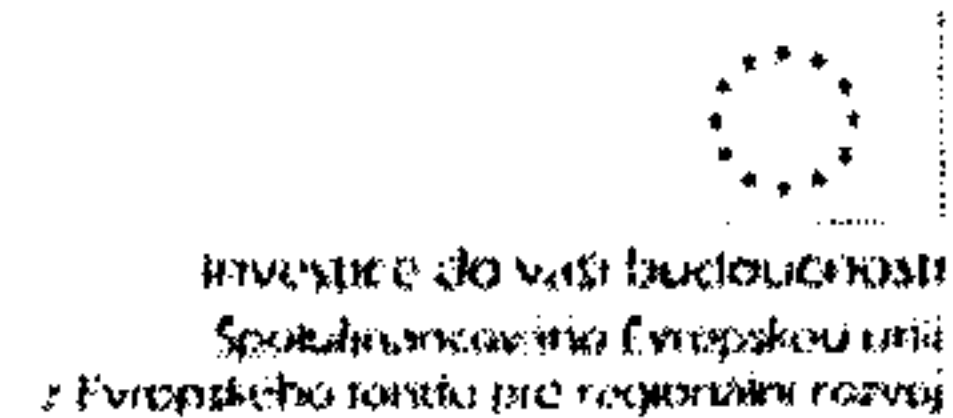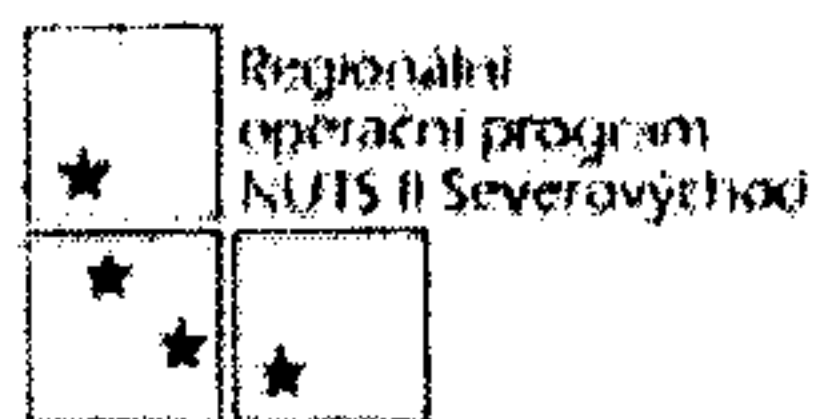



### 13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

MGR. JAN FARSKY

Místo a datum:

SEMILY 22.3.2010

Podpis:

*M. Farský*

